

自衛隊による拠点除染活動について

防 衛 省

自衛隊による拠点除染活動（12月7日～19日）

- 実施時期
12/7（水）～19（月）
- 実施部隊（総勢約900名）
陸上自衛隊東北方面隊第6師団
―第44普通科連隊（福島）
―第6特科連隊（郡山）
- 実施内容
 - ・ 高圧放水等による洗浄
 - ・ 芝生剥ぎ取り、表土除去
 - ・ 側溝清掃等
- 実施場所
県内4ヶ所の町村役場
 - ・ 飯舘村役場（計画的避難区域内）
 - ・ 浪江町役場（警戒区域内）
 - ・ 富岡町役場（警戒区域内）
 - ・ 楡葉町役場（警戒区域内）




自衛隊による拠点除染活動（12月7日～19日）

飯舘村役場

・12月19日作業完了



側溝清掃後の測定

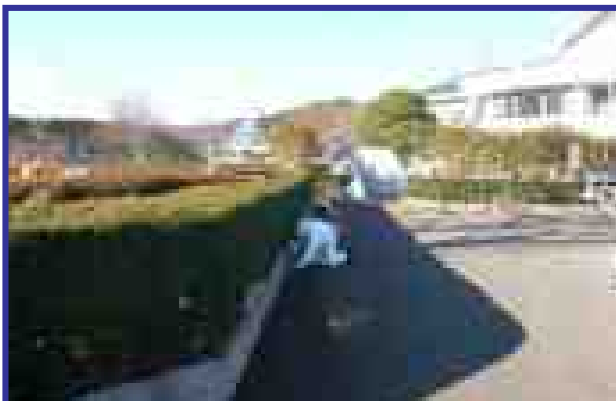

アスファルト面の細かな土壌除去

平均空間線量率(1m、 μ Sv/h)

【アスファルト】

2.94 → 1.96 (33%減)

【芝地】

4.39 → 0.96 (78%減)

※12月22日環境省公表資料

浪江町役場

・12月15日作業完了



側溝の清掃



石畳面の洗浄

平均空間線量率(1m、 μ Sv/h)

【アスファルト】

0.50 → 0.33 (34%減)

【石畳】

0.53 → 0.39 (26%減)

※12月22日環境省公表資料

自衛隊による拠点除染活動（12月7日～19日）

富岡町役場

・12月18日作業完了



平均空間線量率(1m、 μ Sv/h)
【アスファルト】
7.75→3.97(49%減)
【芝地】
8.70→2.27(74%減)
※12月22日環境省公表資料

楢葉町役場

・12月16日作業完了



平均空間線量率(1m、 μ Sv/h)
【アスファルト】
0.77→0.50(35%減)
【建物近傍】
0.41→0.32(22%減)
※12月22日環境省公表資料
